


正式背景上的京张双答运营层

规划是可信底图；公共十字与三站才是设计主角

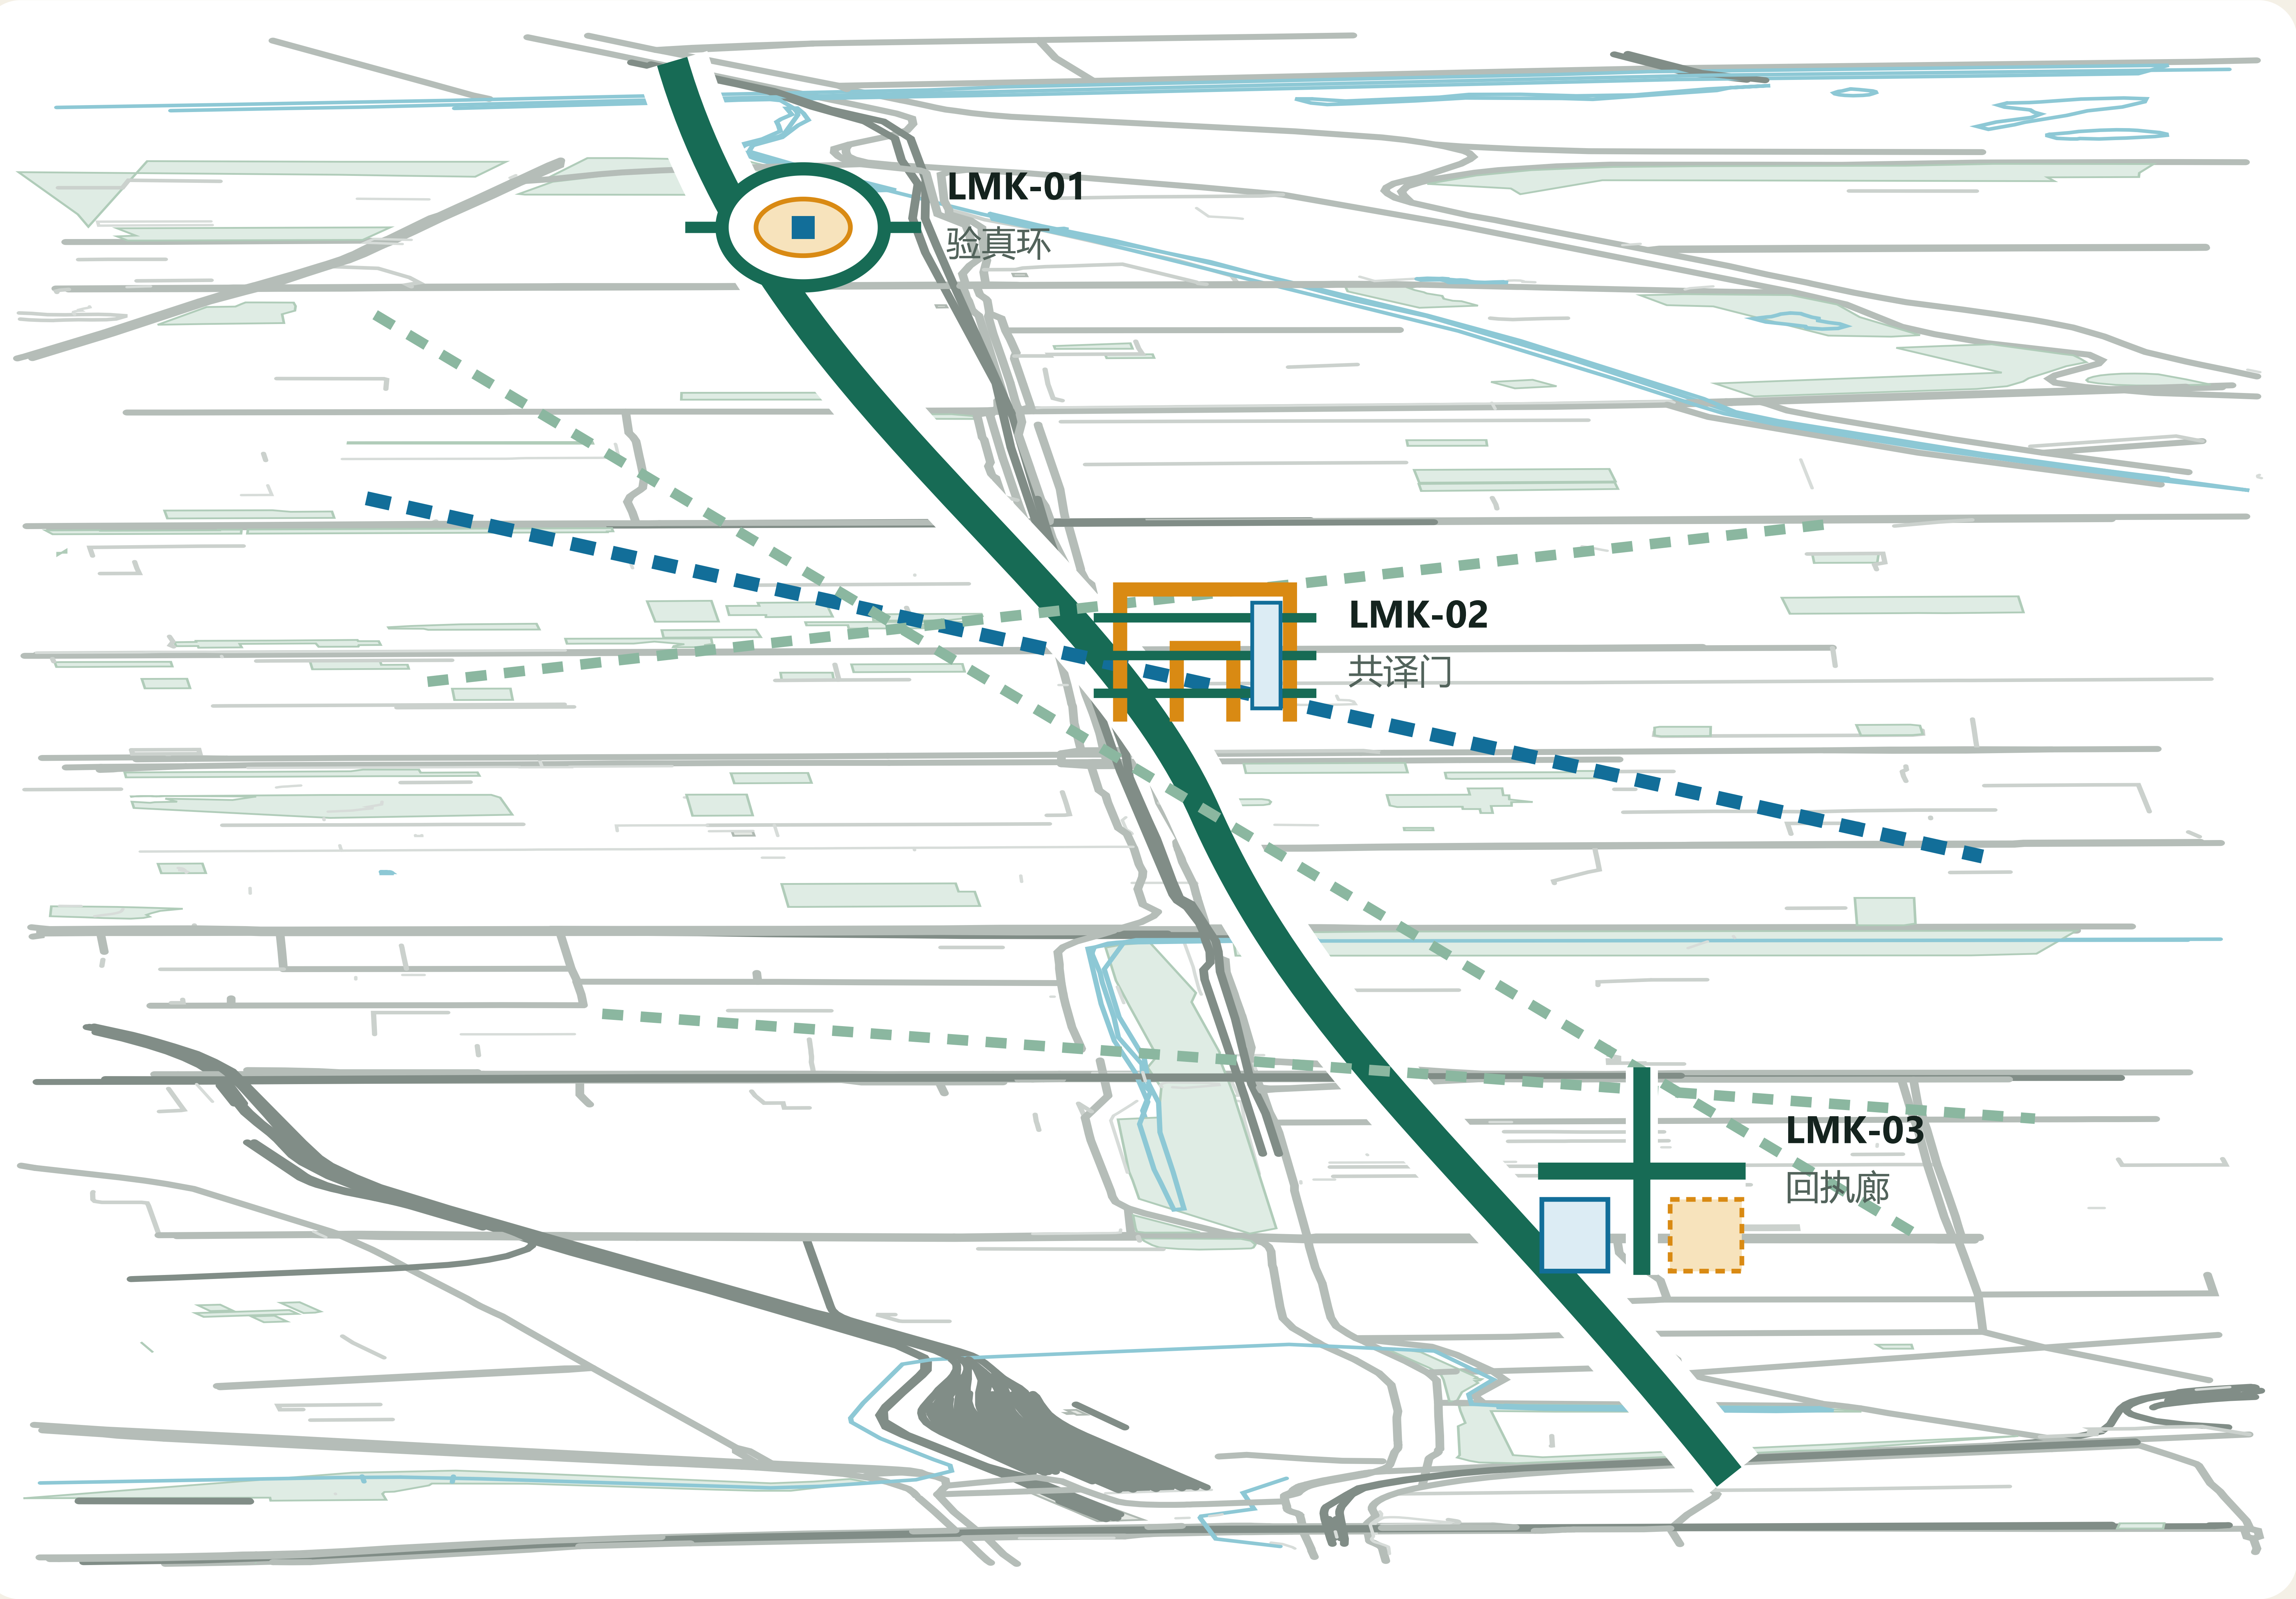

Map data © OpenStreetMap contributors · ODbL · 2026-08-13

一条已公布绿带

一脊三站两翼 = 可停、可撤运营叠加

既有 / 已公布

9km绿带、慢行方向、大钟寺中心

投稿设计

4m路线、单侧湾、人工回执廊

接口窗

环旁路 / 门穿行 / 廊公共十字


未知待核验

测绘、产权、站口、管线、许可






普通开放日  
概念生成图 / 非现场证据；尺寸与边界以矢量模型为准

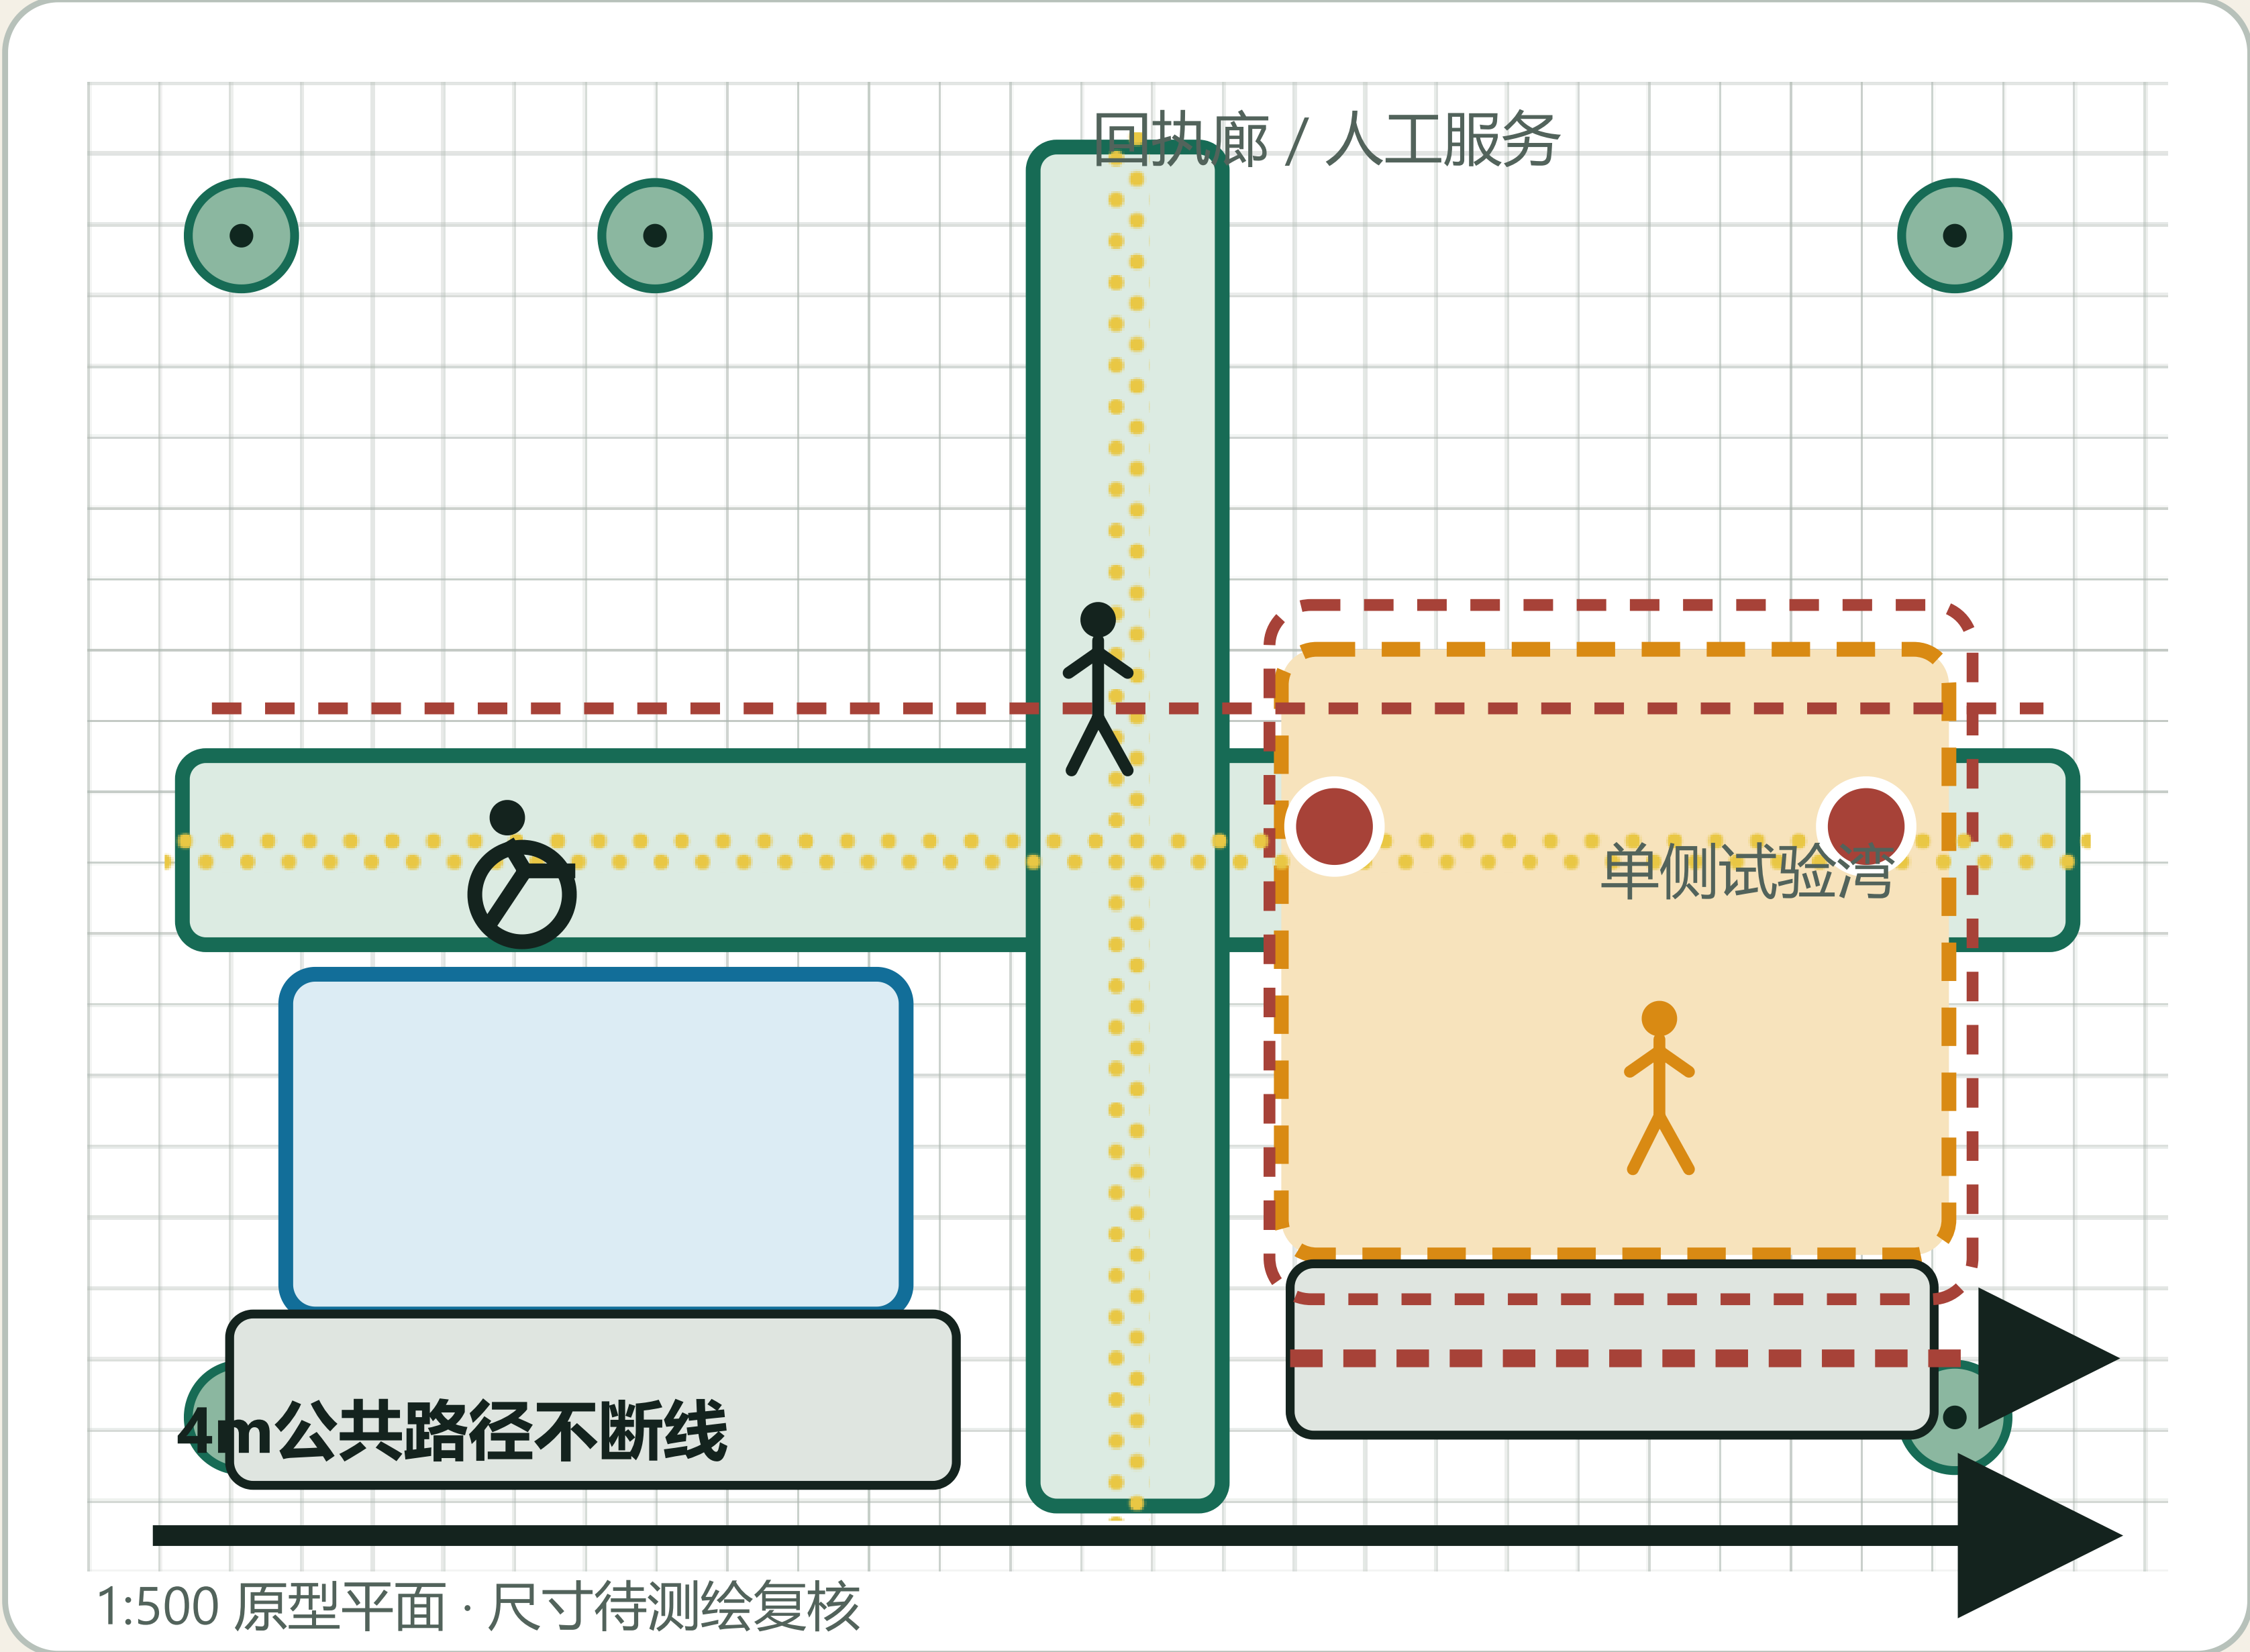


同一空间模型 | 分层剖切装配轴测


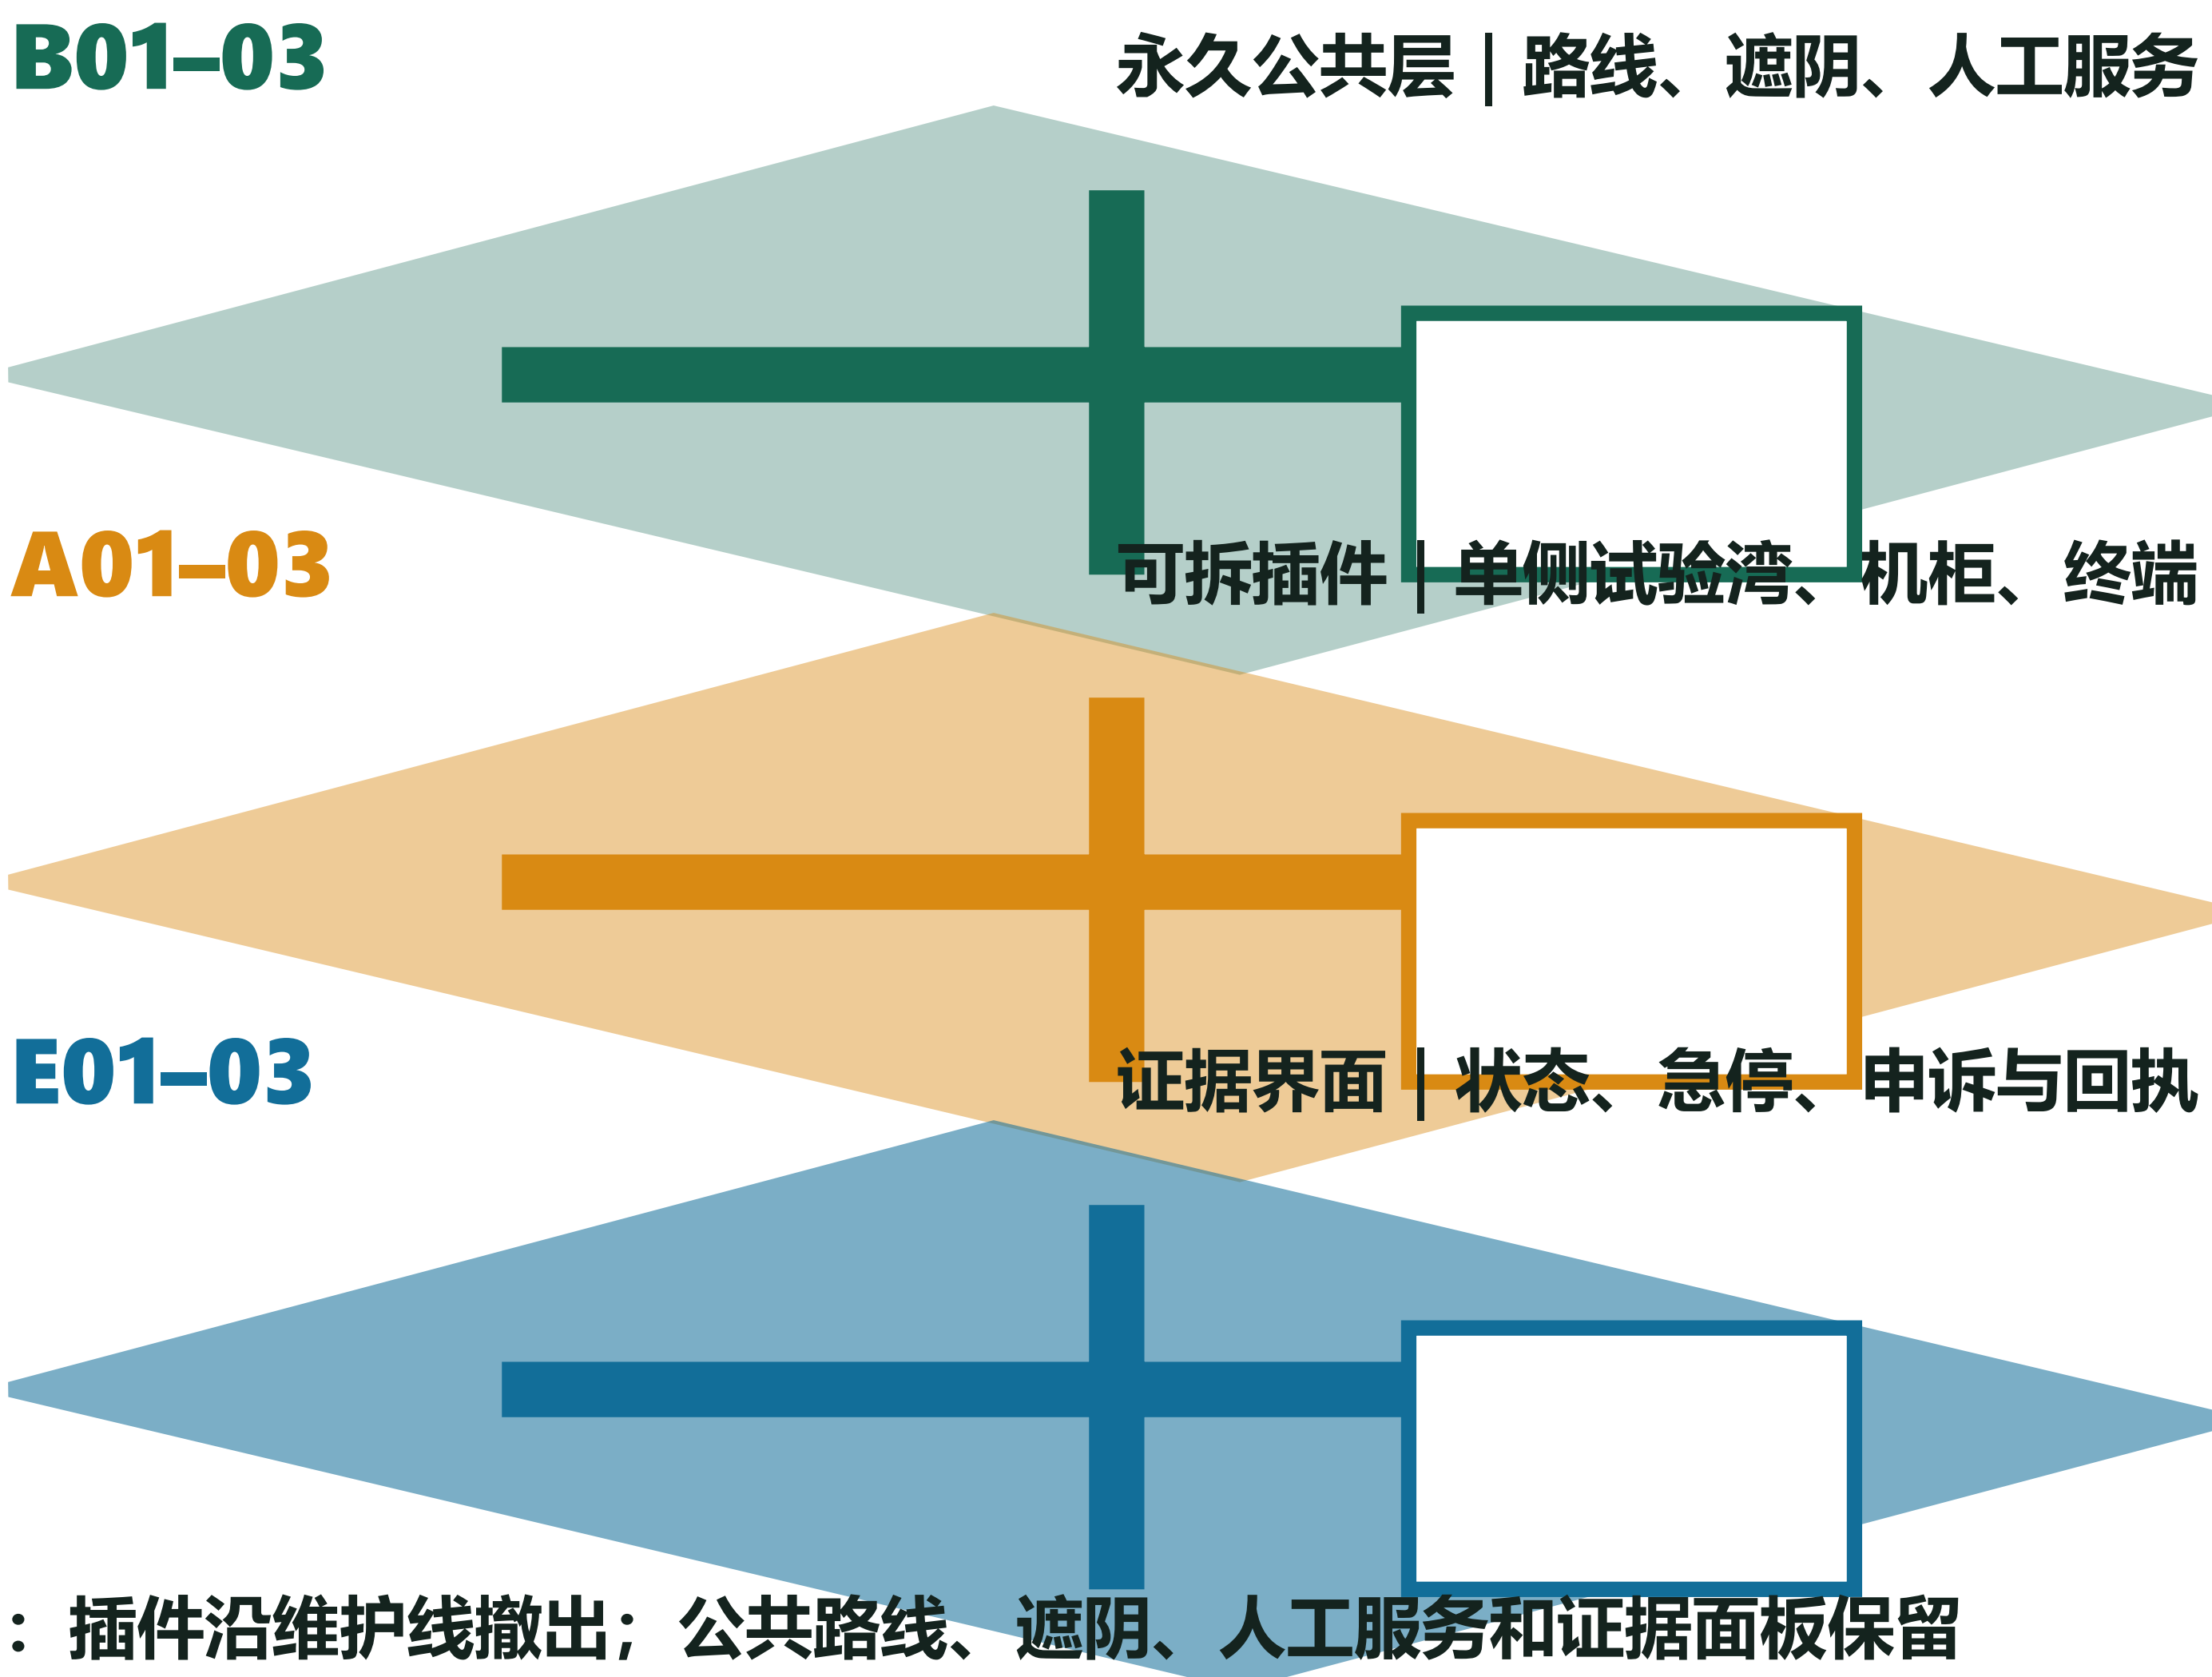


RETIRE: 插件沿维护线撤出；公共路线、遮阴、人工服务和证据面板保留

受控试验日 | 公共路径—缓冲—试验湾—回执廊

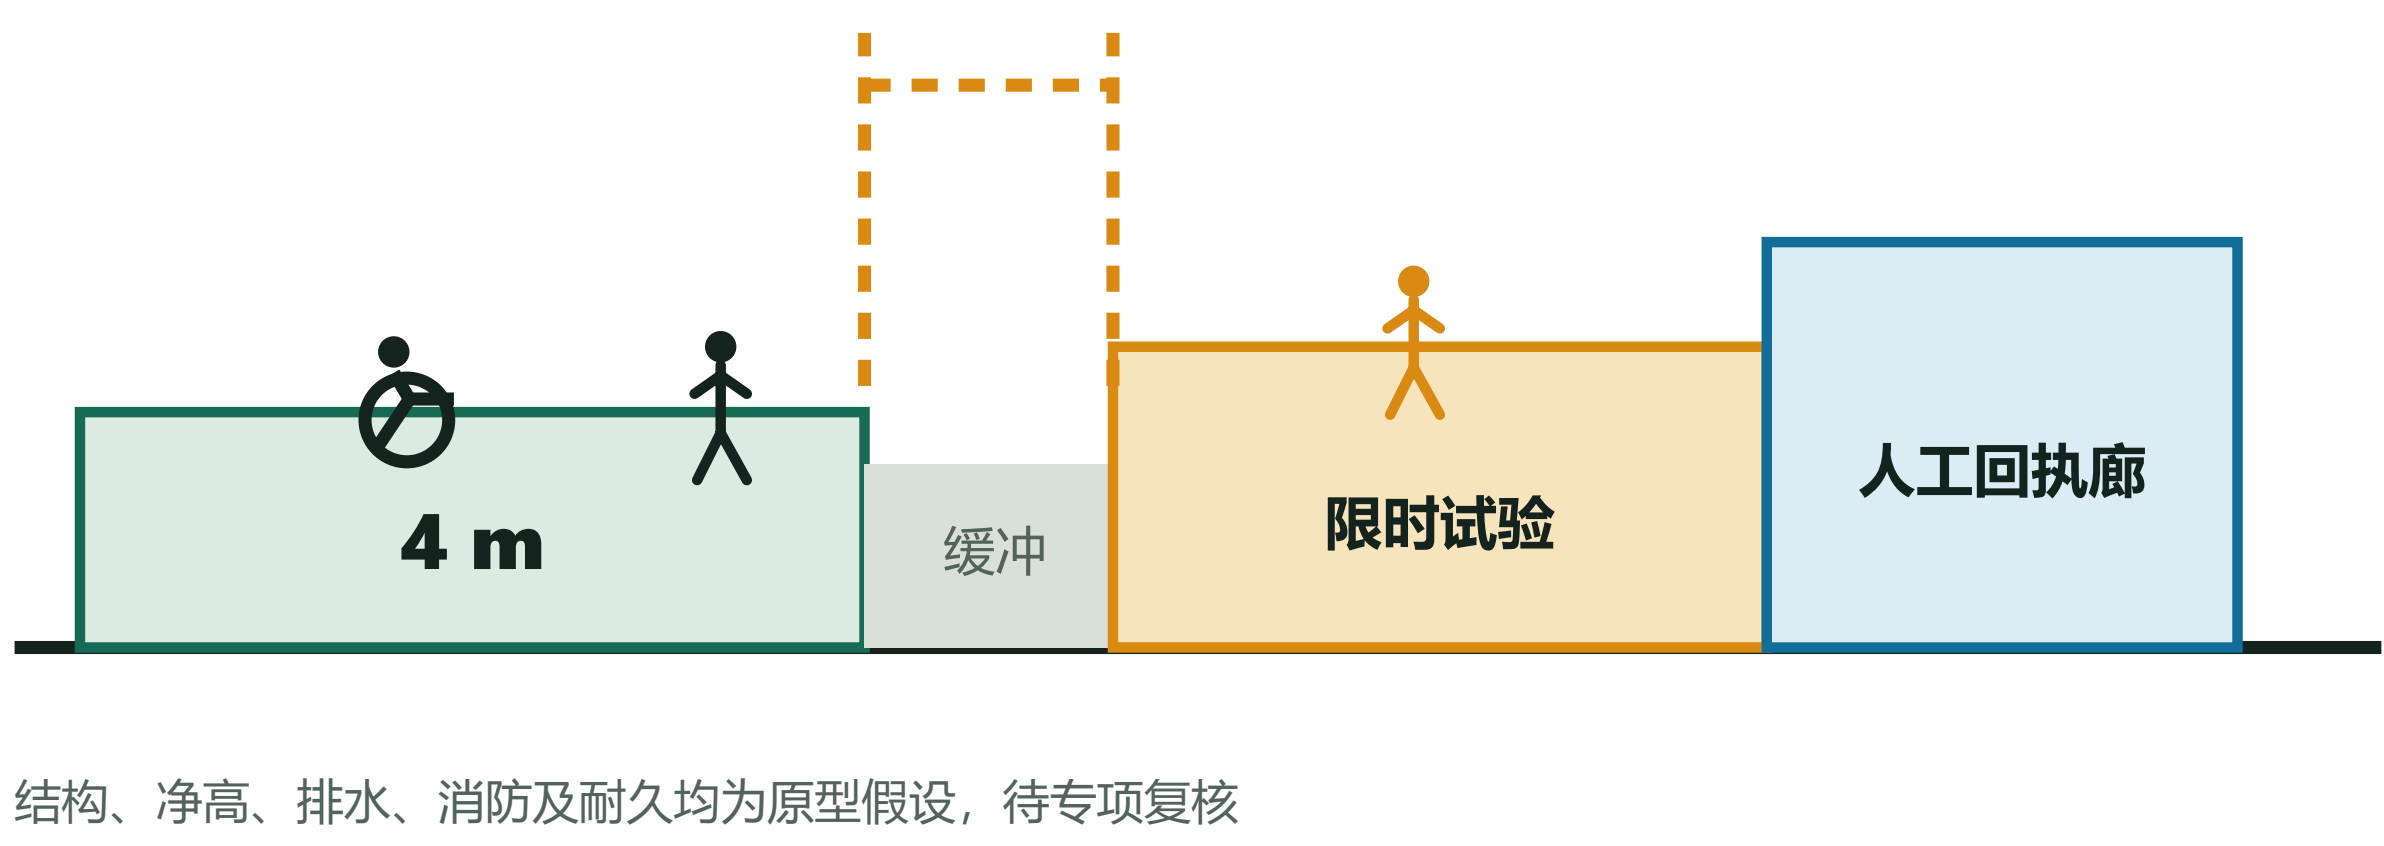

1:50 / 1:20 可逆节点 | 公共层先成立

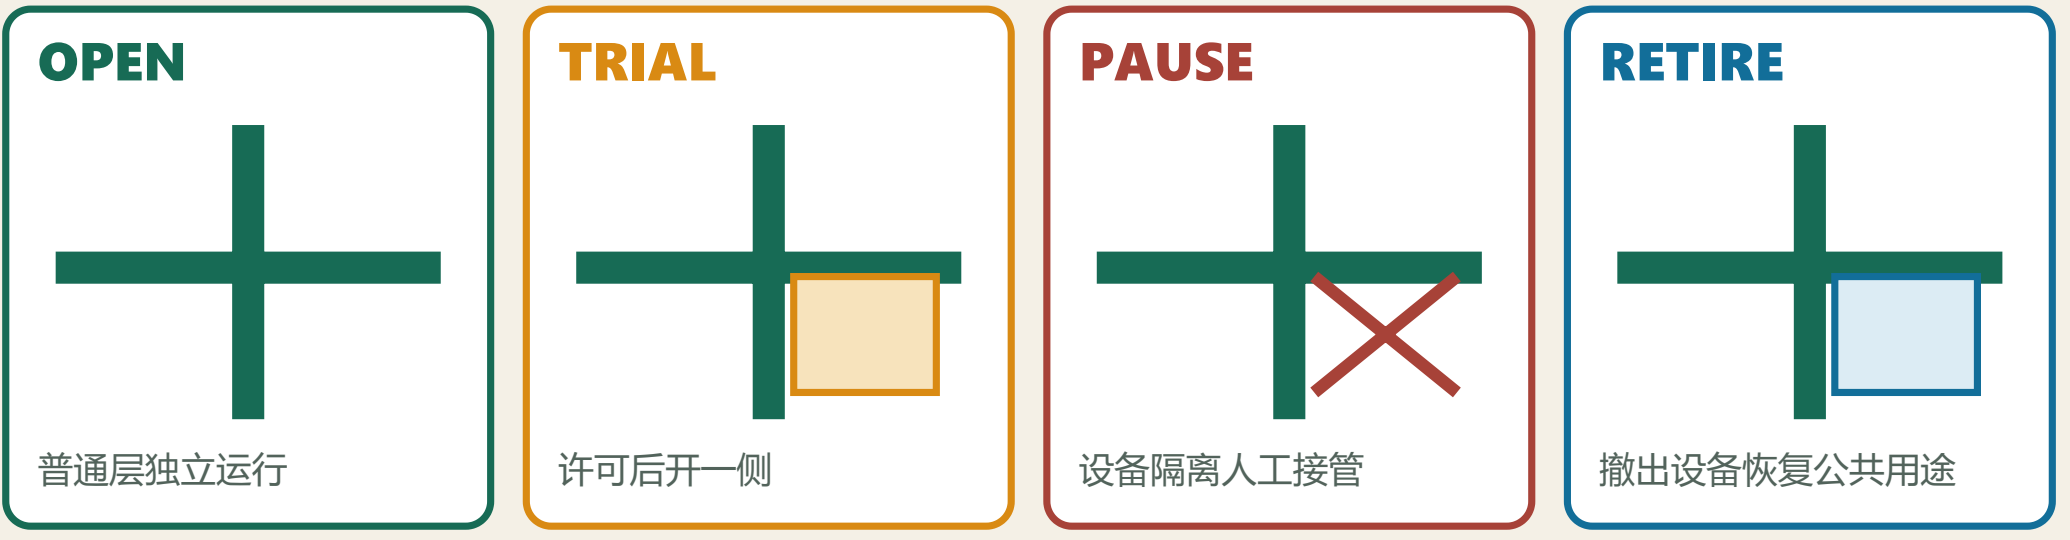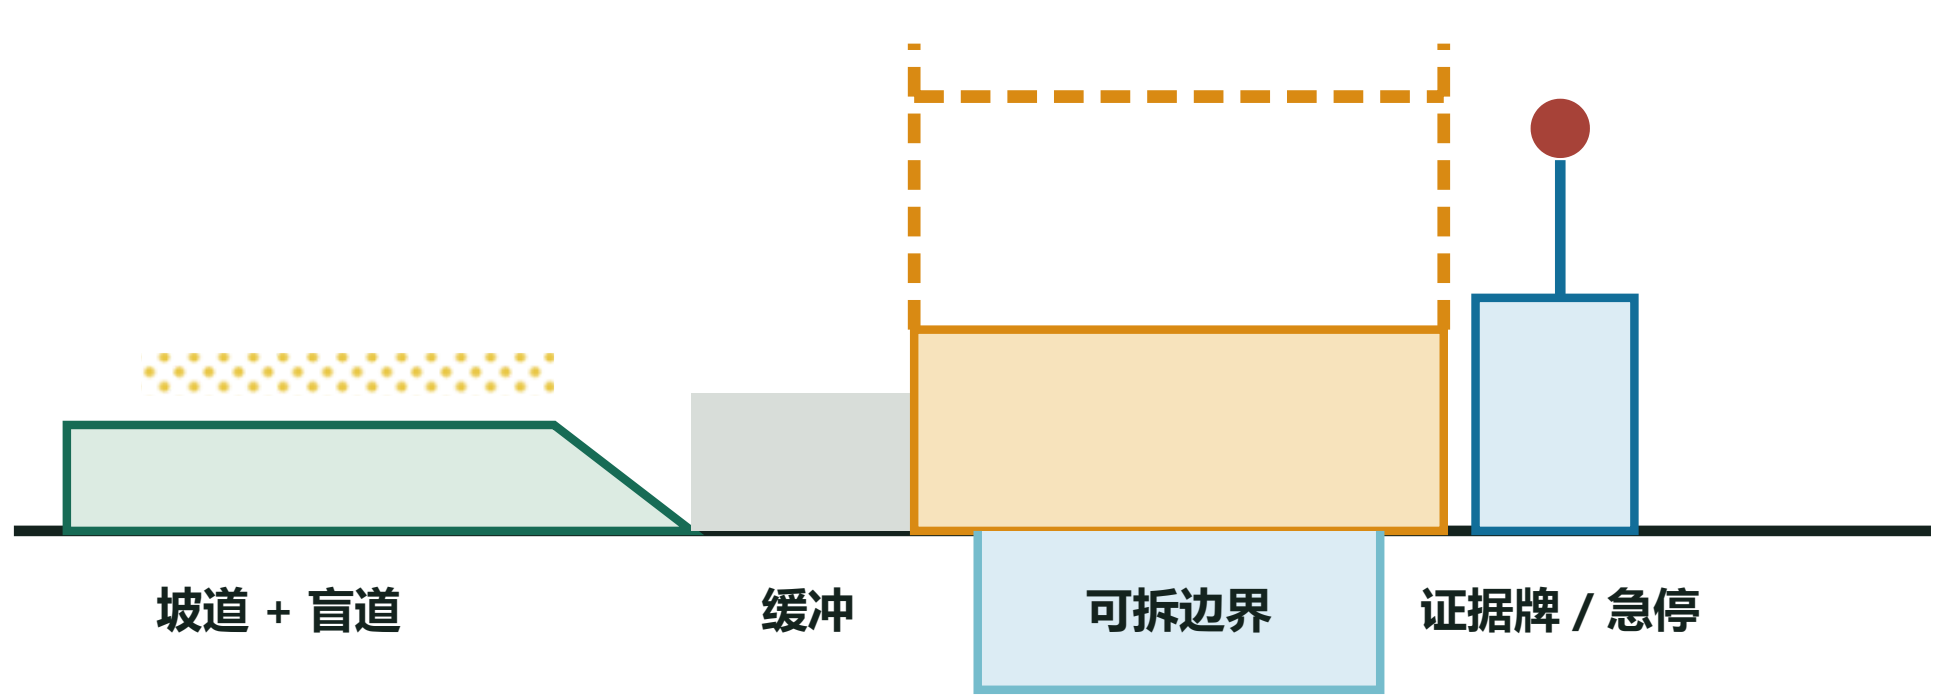



同一把尺子：三个备选，一次公开否决

ALT-A  
中央混合湾

REJECT · 切断公共十字  
公共路线、消防与撤场发生硬冲突。

ALT-B  
分散双湾


REVISE · 监督/撤场碎片化  
公共路线保留，但岗位与设备退出不集中。

ALT-C  
单侧可逆湾


ADVANCE · 四态路线连续  
AI集中于一侧；岗位、急停与退出可达。

结果来自局部米制几何审计；不是现场交通、安全或公众接受度结论。

reject\_design / revise\_design / advance\_design ≠ adopt / revise / stop

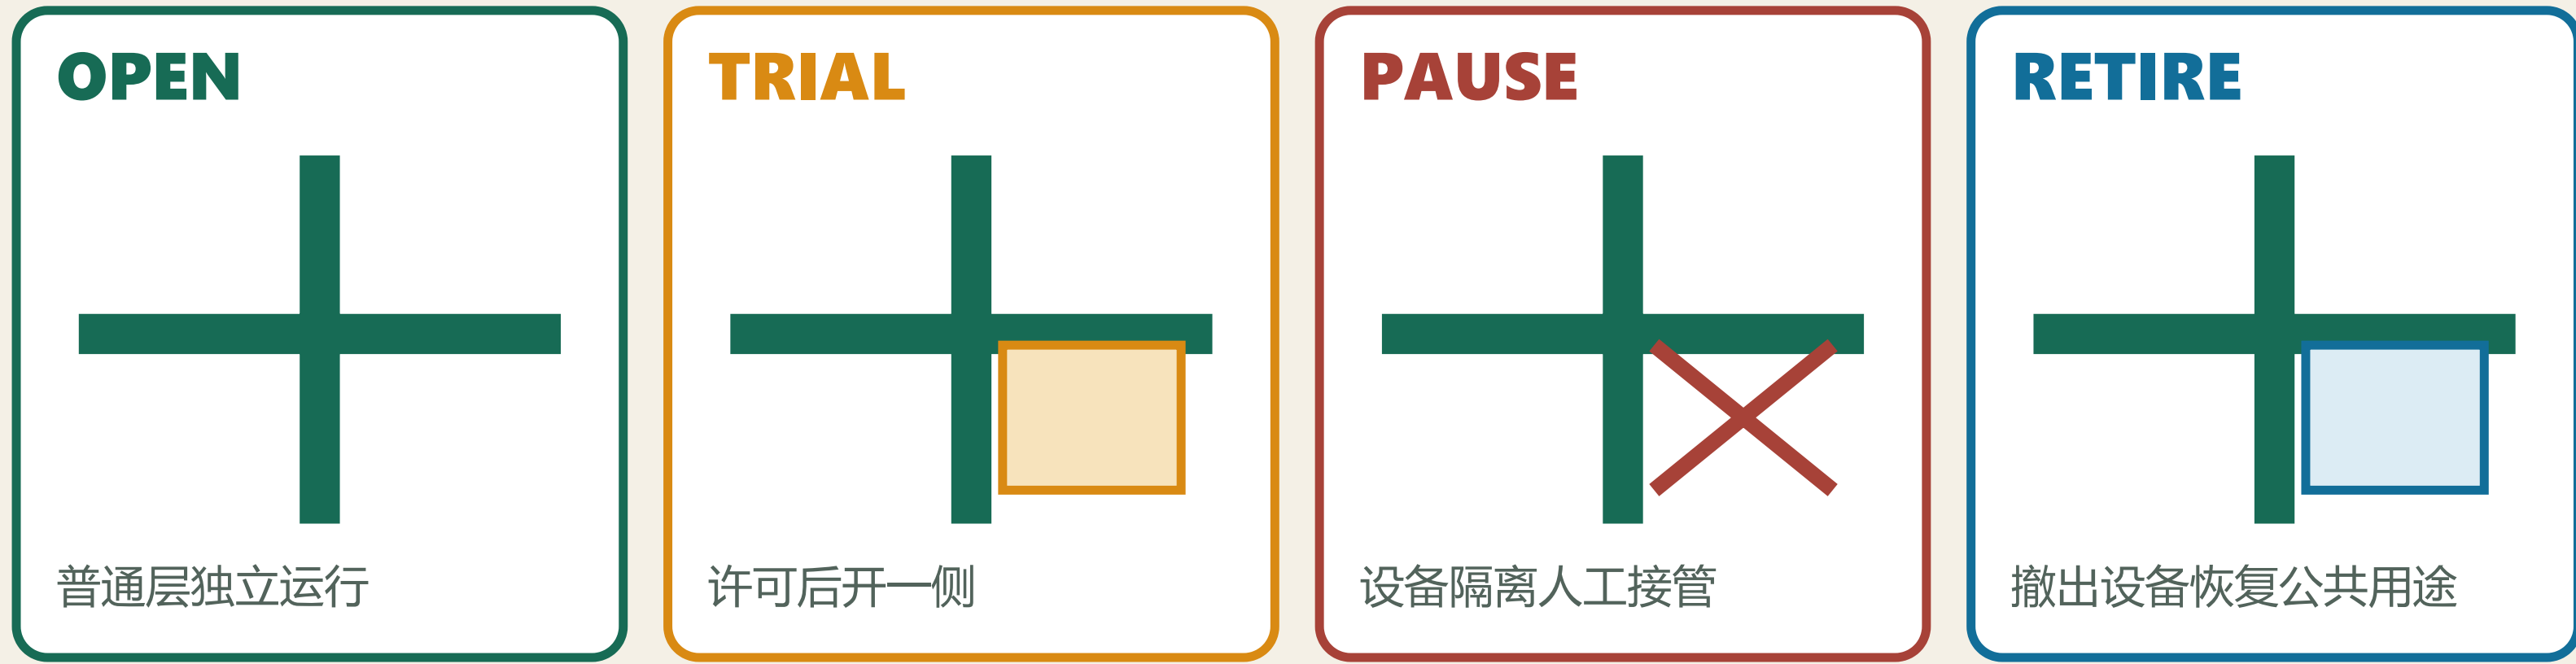

普通开放日 | 公共路线、候车与人工服务独立运行

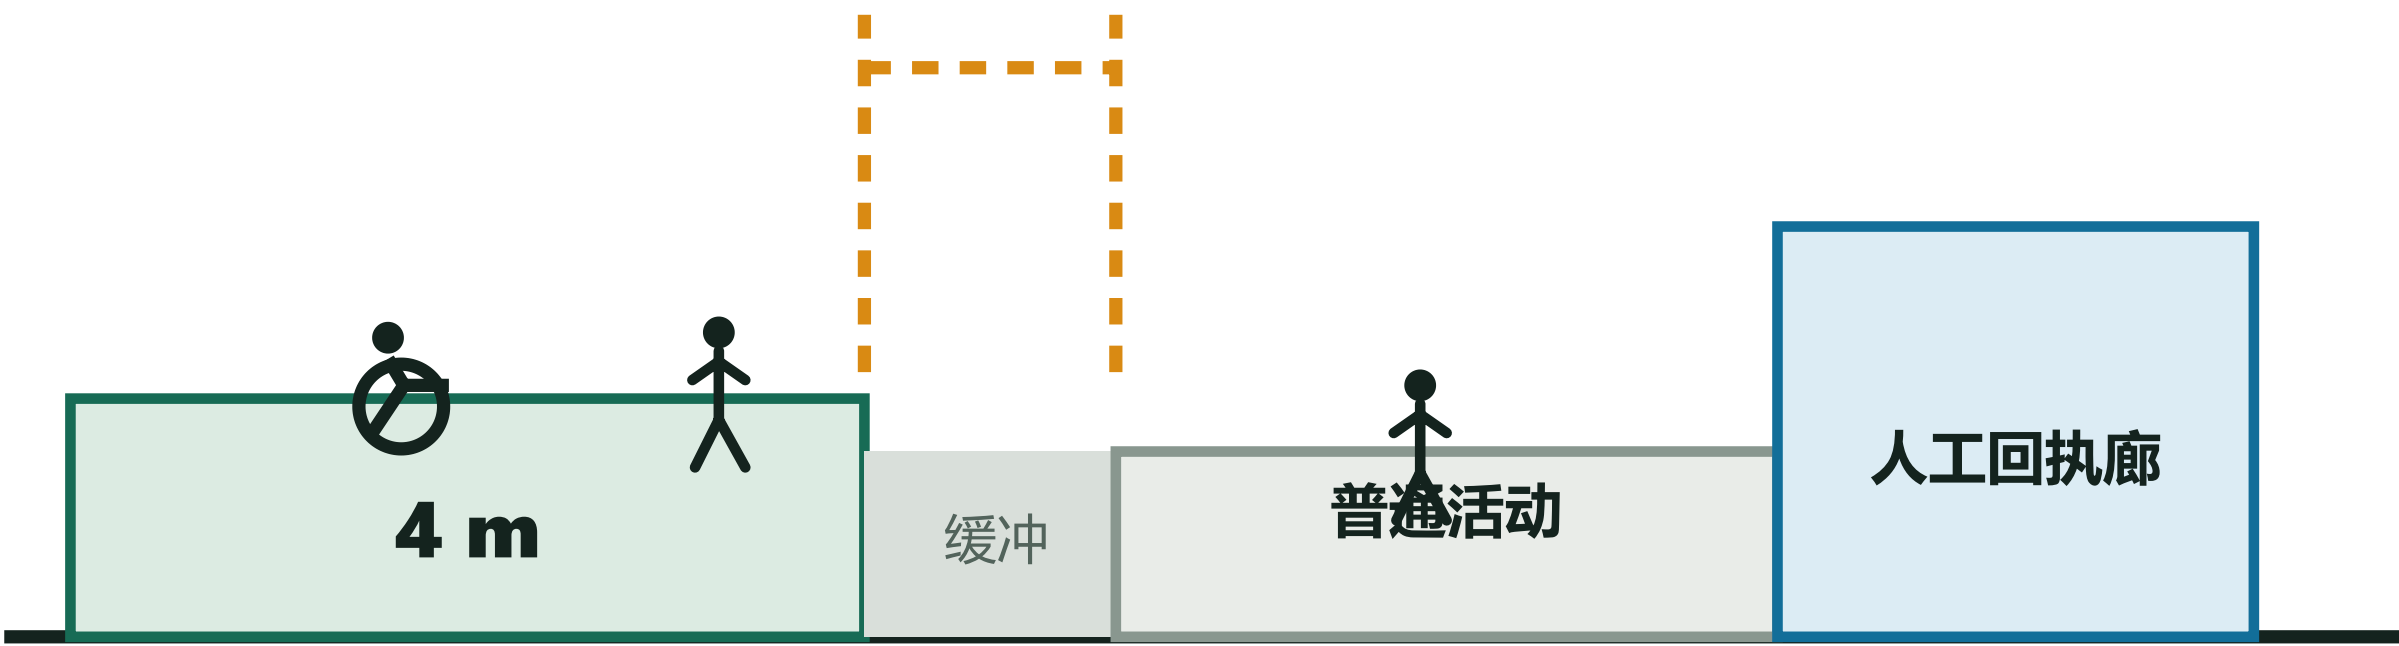

结构、净高、排水、消防及耐久均为原型假设，待专项复核

普通开放日先运行 | 90天是五道进入条件

|                                                         |                                                           |                                                     |                                                      |                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DAY 0-15</b><br>测绘/权属/站口/管线/消防核验<br><br>失败 → 不进入下一阶段 | <b>DAY 16-30</b><br>只搭公共路径、候车、遮阳、人工服务<br><br>失败 → 不进入下一阶段 | <b>DAY 31-45</b><br>记录7个连续普通运行日<br><br>失败 → 不进入下一阶段 | <b>DAY 46-75</b><br>许可+岗位齐全后限时试验<br><br>失败 → 不进入下一阶段 | <b>DAY 76-90</b><br>停止演练、撤场恢复、公众回执<br><br>失败 → 不进入下一阶段 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| 构件—许可—维护直接对应图面 |                              |
|----------------|------------------------------|
| B01-03         | 公共路线/遮阳/人工服务<br>日检；永久保留      |
| A01-03         | 试验湾/机柜/终端<br>每次试验前；撤出        |
| E01-03         | 状态/急停/回执<br>开闭场复核；面板保留       |
| MAT-01-05      | 干式钢架/屏/基础/铺装/面板<br>专项复核；可逆装配 |

| 责任与下一道门                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01                                                                  | 场地负责人<br>待落实  |
| 02                                                                  | 普通服务人员<br>待落实 |
| 03                                                                  | 安全负责人<br>待落实  |
| 04                                                                  | 数据记录人员<br>待落实 |
| 当前 G0：进入测绘与许可准备<br>PENDING_MARKET_QUOTE · NOT BUILT · NOT FIELD-RUN |               |

证据台账 | 设计选择 → 实施准备 → 现场测量

未知项保持空值；G0是下一步，不是主视觉

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b><br>设计选择<br><br>ALT-A / REJECT<br>切断公共十字，消防与撤场冲突<br><br>ALT-B / REVISE<br>路线保留但监督与撤场碎片化<br><br>ALT-C / ADVANCE<br>单侧可逆湾，4m路线四态不断线<br><br>几何审计<br>21道硬门；计算不等于现场绩效 | <b>02</b><br>实施准备<br><br>当前 G0<br>进入测绘与许可准备<br><br>八类许可<br>场地/消防/无障碍/临电/网络/交通/设备<br><br>四个独立岗位<br>场地、普通服务、安全、数据记录<br><br>90天五阶段<br>失败即退回普通开放，不进入试验 | <b>03</b><br>现场测量<br><br>12份测量契约<br>分母、样本、责任、停止、恢复已定义<br><br>现场结果<br>0；客流、安全、效率、能耗仍未知<br><br>空白回执<br>adopt / revise / stop 由人类委员会填写<br><br>退出恢复<br>计时方法已定义，恢复时长待演练 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

价格只保留数量公式；任何许可、岗位、普通基线或撤场演练失败，都不进入AI试验。

合成验证只检查规则自洽；公开事实、设计假设与现场未知始终分层。
